


Nouvelle usine de traitement des eaux usées de Cap-Brulé

MISE À JOUR DU PROJET n°. 27, Octobre 2025



La construction du nouveau bâtiment de pré-traitement des eaux usées :

- Les activités en cours comprennent le remblayage, le coffrage, l'installation d'armatures, le coulage du béton, l'installation des premiers escaliers dans la salle UV, l'étanchéité et l'isolation des structures, ainsi que l'installation de tuyaux en béton et en acier inoxydable.
- Les travaux de béton ont progressé avec le coffrage, l'installation des armatures, le coulage du béton, le remblayage, l'étanchéité et l'isolation des semelles et des colonnes des murs antigel de la salle UV.
- Les travaux de béton ont progressé avec le coffrage, l'installation des armatures et le coulage du béton sur la dalle de la salle UV et celle de la salle mécanique de la station de pompage.
- Conclusion de l'installation de la conduite d'égout en béton de 900 mm et des conduites d'air.
- Réception des générateurs et de l'équipement de dégrillage.

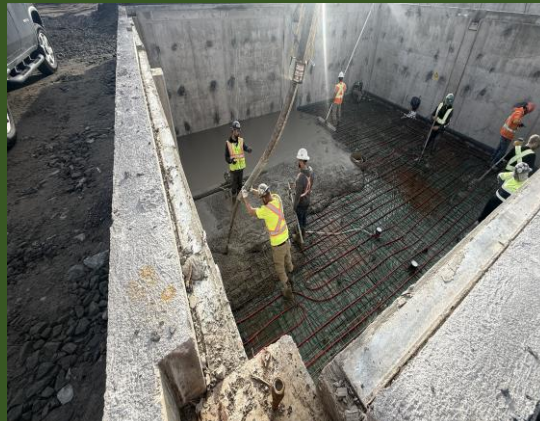

ENGLOBE
